

Informe Resumido Bisemanal al 04 Setiembre 2009 - GTZ
Programa MOPT-KfW, Rehabilitación de la Red Vial Cantonal



A. Ejecución Física y Financiera

Ejecución Física:

	al 21.08.2009	al 04.09.2009
Caminos rehabilitados	706,0 km (nuevos: Sarapiquí 4-10-162, Abangares 5-07-030)	718,6 km (nuevos: Sarapiquí 4-10-161, San Carlos 2-10-152)
Rehabilitaciones en proceso (con Orden de Inicio):	143,8 km (PZ: 1-19-016, 112, 068, 050, 049 Sarap: 4-10-009, 032, 035, 134, 161, Abang: 5-07-030, 048, San Carlos 2-10-152, 008, 463, 961, Península 6-01-275, 005, 075, Pococí 7-02-025, Los Chiles 2-14-047, 048, Bagaces 5-04-019, 015, 001, 003, Buenos Aires 6-03-027).	165,0 km (PZ: 1-19-016, 112, 068, 050, 049, 042, Sarap: 4-10-009, 032, 035, 134, 052/2, 163, Abang: 5-07-018, 048, San Carlos 2-10-008, 463, 961, 064, 088, Península 6-01-275, 005, 075, Pococí 7-02-025, 013, 039, Los Chiles 2-14-047, 048, Bagaces 5-04-019, 015, 001, 003, Buenos Aires 6-03-027, 019).
Contrataciones adjudicadas (firme)	159,1 km (alquiler de maquinaria y obra terminada)	125,3 km (alquiler de maquinaria y obra terminada)
Licitaciones en proceso	44,4 km	44,4 km
En preparación para licitar	0 km	0 km

Ejecución Financiera: Facturas canceladas y en proceso

	al 21.08.2009	al 04.09.2009
Facturas canceladas y cargadas al Fondo de Disposición	6.508.535.328 colones (8.874.151 €)	6.874.164.073 colones (9.322.913 €)
Facturas en proceso de pago	563.938.723 col. (aprox. 700.545 €)	542.376.377 col. (aprox. 662.242 €)
Saldo Fondo de Disposición	932.043,35 €	483.281,18 €

B. Estado de Situación

1. Contratos de alquiler de maquinaria por autorización CGR del 2005 (6 caminos: 35km, PZ, BA).

Necesidades de actuación	Plazo	Responsable
Justificar rescisión de 6 contratos (SECONSA, Polvo Piedra, Acsel)	04 setiembre	DE / GTZ

2. Licitaciones antiguas atrasadas:

Necesidades de actuación	Plazo	Responsable
Concluir los 4 caminos en Sarapiquí, 15.4km (Maquinaria Muni/MOPT)	Octubre 2009	DR, Muni
Concluir los caminos 5-07-018 y 048 de Abangares con Maquinaria MOPT	Setiembre	DR

3. Contrataciones obras por contrato de 2007

Necesidades de actuación	Plazo	Responsable
LN 071-2007, Península, 9.0km: Rehabilitar 3 caminos con contrato de ALBOSA	Setiembre- Octubre	Contratista / DR
LN 083-2007 Sarapiquí 19.1km, Equipos Mata: Rehabilitar caminos	Junio – setiembre	Contratista / DR

4. Contrataciones obras por contrato con fondos nacionales de 2008 (aprox. 91.6 km)

Necesidades de actuación	Plazo	Responsable
2008-LA00545, Pococí, 5.7km: Rehabilitar camino 025 con contrato y addendum de Naguz.	Setiembre 2009	DE / Contratista

5. Contrataciones de obra terminada con fondos del préstamo de 2008

Necesidades de actuación	Plazo	Responsable
LN 029 Pérez Zeledón (25km): Rehabilitar caminos con contrato de Hnos Brenes	Mayo – octubre	Contratista / DR

6. Contrataciones de obra terminada con fondos nacionales de 2009

Necesidades de actuación	Plazo	Responsable
2008LN-108, Buenos Aires, 14.2km: Rehabilitar caminos con contrato de Hernández y Martins (contrato suspendido)	Agosto – octubre	Contratista / DR
2008LN-110, Los Chiles, 18.7km: Rehabilitar caminos con contrato de Constr. Herrera	Julio-octubre	Contratista / DR
2008LN-114, San Carlos, 40.4km: Rehabilitar caminos con contrato de Bajo del León	Julio-diciembre	Contratista / DR
2008LN-107, Bagaces 19,7km: Rehabilitar caminos con contrato de Hnos Brenes	Julio - Octubre	Contratista / DR
2008LN-112, Pérez Zeledón, 19.7km: Rehabilitar caminos con contrato de Hnos Brenes	Setiembre-diciembre	Contratista / DR
2008LN-113, Pococí 47,1km, Rehabilitar caminos con contrato de Constr. MECO	Setiembre-diciembre	Contratista / DR
2008LN-109, Guatuso, 16.3km: Dar Orden de Inicio al contrato de Carga y Estiba	18 setiembre	Contratista / DR
2008LN-111, 21km Orotina, San Mateo: Esperar refrendo de CGR para contrato de Consorcio EMCOPG	25 setiembre	CGR
2009LA-221, Buenos Aires, 3km: Elaborar informe de adjudicación y adjudicar licitación	07 agosto	Proveeduría
2009LA-312, Osa, 4.5km: Analizar ofertas de la licitación de Obra Terminada (Estudio de razonabilidad)	21 agosto	DE, Dir. Juríd, Financiero

7. Contrataciones de obra terminada con fondos del préstamo

Necesidades de actuación	Plazo	Responsable
2009LA-188, Corredores, 10.8km, 2009LA-189, Desamparados, 6.6km y 2009LA-197, Golfito, 8.4km, 2009LA-197, Osa, 6.6km: Elaborar informe de adjudicación y adjudicar licitación	07 agosto	Proveeduría
2009LA-190, Sarapiquí, 9.0km: Elaborar informe de adjudicación y adjudicar licitación	21 agosto	Proveeduría
2009LA-360, Coto Brus 11.6km: Analizar ofertas de la contratación de alquiler de maquinaria	18 setiembre	DE, Dir. Juríd, Financiero

C. Vehículos y otros:

Necesidades de actuación	Plazo	Responsable
Dar seguimiento al uso de los vehículos alquilados (15) de Adobe Rent a car según necesidad.	permanente	DE, GTZ



D. Asuntos rezagados:

1. **2009LA-221, Buenos Aires, 3km: Elaborar informe de adjudicación y adjudicar licitación** Proveeduría
2. **2009LA-188, Corredores, 10.8km, 2009LA-189, Desamparados, 6.6km y 2009LA-197, Golfito, 8.4km, 2009LA-197, Osa, 6.6km: Elaborar informe de adjudicación y adjudicar licitación** Proveeduría
3. **2009LA-312, Osa, 4.5km: Analizar ofertas de la licitación de Obra Terminada (Estudio de razonabilidad)** DE

Elaborado por: Consultoría GTZ el 04 de setiembre de 2009.

Copias: - Funcionarios responsables de MOPT, KfW y GTZ.

Programación de Cierra
Según Cronograma de Ejecución actuazliado en abril 2009

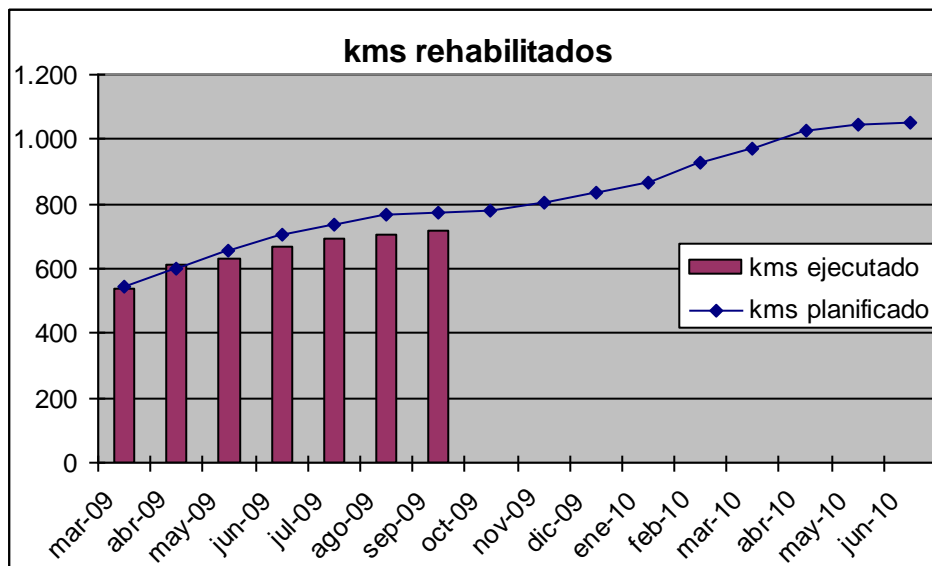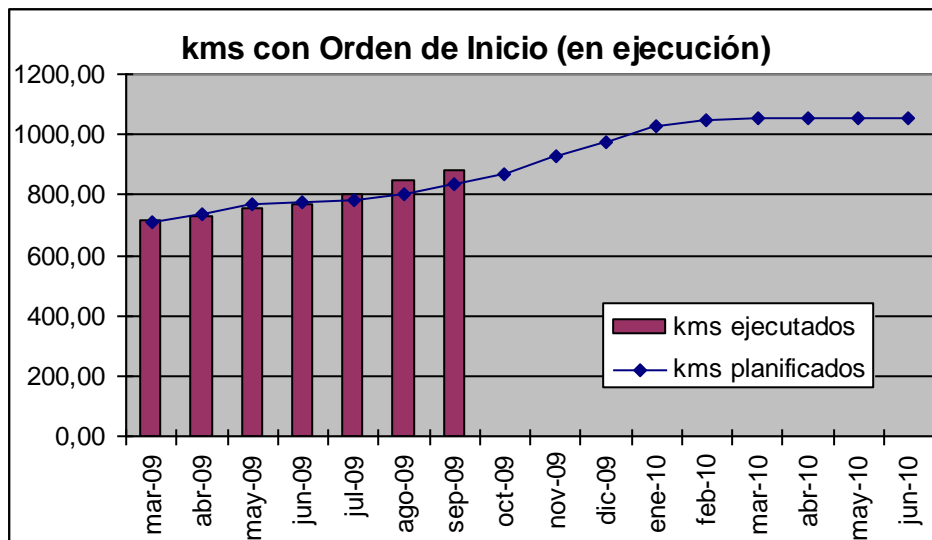

Caminos rehabilitados:

2006	Abangares 5-07-010, San Carlos 2-10-056, 057, Los Chiles 2-14-012. Total 26,6km
2007	San Carlos 2-10-100, Nicoya 5-02-003, Santa Cruz 5-03-002, 003, 004, 066, Buenos Aires 6-03-010, 009, Los Chiles 2-14-009, Pococí 7-02-037, 032, 021 Sarapiquí 4-10-007, 044, 052, Pérez Zeledón 1-19-148, Turrialba 3-05-012, 079, 039. Total acumulado 133,6km
2008	Buenos Aires 6-03-012, 013, Osa 6-05-006, 008, 019, Paquera 6-01-021, 020, 019, Pérez Zeledón 1-19-101, 059, Lepanto 6-01-007, 015, 046, San Carlos 2-10-106, Los Chiles 2-14-008, 017, 007, 041, 052, 043, 021, 024, Pococí 7-02-145, 039, 194, Coto Brus 6-08-010, 092, 047, 067, 044, 072, Abangares 5-07-007, 009, 035, 028, 005, Santa Cruz 5-03-042, 163, Turrialba 3-05-038, 014, 022, 047, Siquirres 7-03-022, 035, 035/2, 036, 070, 047, 018, Nicoya 5-02-042, 046, Grecia 2-03-052, Sarapiquí 4-10-037, Cóbano: 6-01-001/2, Cañas 5-06-018 Total acumulado 469,5km
2009	Turrialba 3-05-046, 033, 034, 044, 077, 039/2, San Carlos 2-10-066, 069, 068, 041, 052, 102, 119, 810, 202, 152, Grecia 2-03-168, 066, 183, Coto Brus 6-03-074, San Ramón 2-02-054, 058, 006, 016, 137, Cañas 5-06-006, 003, Pérez Zeledón 1-19-090, 081, 236, 098, Guácimo 7-06-027, 005, Naranjo 2-06-031, 044, 008, 007, 022. Corredores 6-10-001, 017, Abangares 5-07-018/2, 018, Sarapiquí 4-10-052/3, 164, 162, 161, Nicoya 5-02-033, 081, 029 Santa Cruz 5-03-067 Total acumulado 718,6km
